

Proces, udfordringer og muligheder i forbindelse med næste version af rammeaftalen SKI 02.19

29. September 2021

Allan Schiellerup Bager
Chefkonsulent, KLS

Proces/Tidsplan for SKI 02.19 Version 4

Aktuelle aktiviteter:


- Dialog med kunder 1:1
- Dialog med leverandører 1:1
- Ekspertgruppedialog
 - 1. møde afholdt 23/8-21
 - Fokuspå møde (Kommuner) 5/10-21
- Markedsanalysedokumentation
- Aftaledesign
- Fokus på Rammeinfrastrukturkrav:
 - I leverandør- og kundemøder
 - Løbende i Task-force
 - Møde med KOMBIT planlægges
 - KITA 23-24/9
 - Deltagelse med indlæg på Data- og Infrastrukturdag 27/9-21 med Favrskov - og Viborg kommune
 - Denne drøftelse
 - ...

Overordnet tidsplan (forventet)

Dato	Aktivitet
15. november 2021	Markedsanalyse og aftalestrategi afsluttet
31. marts 2022	Udbudsdesign på plads og godkendt
30. september 2022	Udbudsmaterialet udarbejdet og godkendt
3. oktober 2022	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale
21. december 2022, kl. 13:00	Tilbudsfrist (offentligt udbud)
31. marts 2023	Evaluering af tilbud og tildeling af leverandører afsluttet
14. april 2023	Kontrakter indgået med de tildelte leverandører
28. august 2023	Implementering afsluttet
30. august 2023	Idriftsættelse


Kendte udfordringer med RA og 02.19

- "KOMBIT-krav" ikke indarbejdet godt nok på nuværende aftale → uklarhed → høje priser / risikoadfærd hos leverandører
- Endnu ingen samlet klarmelding af en service → kunderne får ikke det de har betalt for
- Klarmeldingskriterier/onboardingforløb er fine initiativer, men ikke indeholdt i aftalen → det kan ikke bruges juridisk ift. kontraktvister
- Pilotkommuneaktiviteter er voldsomt ressourcekrævende for både kommuner og leverandører → det går langsomt med klarmeldingerne
- Det er usikkert om klarmelding fra én kommune reelt betyder at en integration er grydeklar til brug for alle 98 kommuner → fortsat diskussion om ekstraregninger/scope-creeping under implementering
- Markante ændringer i services fx DigitalPost vs. NGDP er ikke beskrevet i aftalen → ekstraregninger
- ...

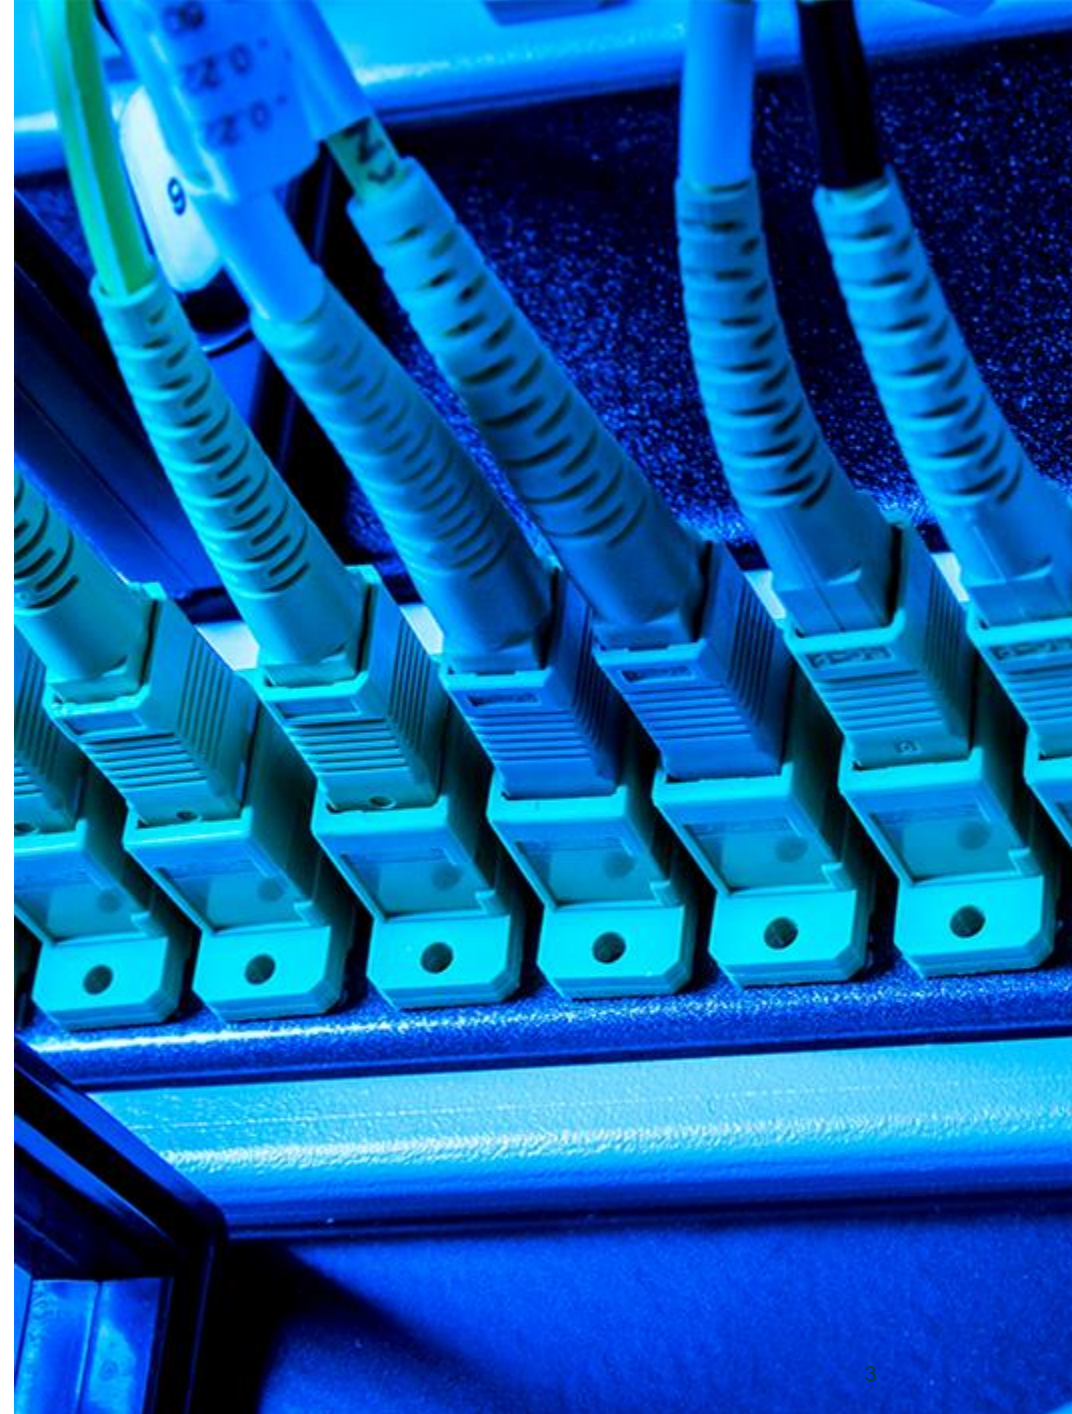

Krav til næste version 02.19

- Skarpe, målbare krav, som er tydelige for både leverandører og kunder, både ved tildeling og drift af aftalen
- Vi tror at også næste version skal håndtere bevægelighed i både krav og leverandørernes opfyldelse af dem. Det peger på miniudbud hvor en "skønhedskonkurrence" kan indgå i evalueringen. Problemet er at kommunerne ønsker direkte tildeling, hvor der ikke kan evalueres nu, det er sket på rammeaftaletidspunktet.
- Faktisk rigtig god opbakning til kravene, både fra kommuner og leverandører. Det skal bare i praksis fungere bedre.
- ATP(UDK) skal kunne stille kravene også, det kan de ikke i dag
- ...

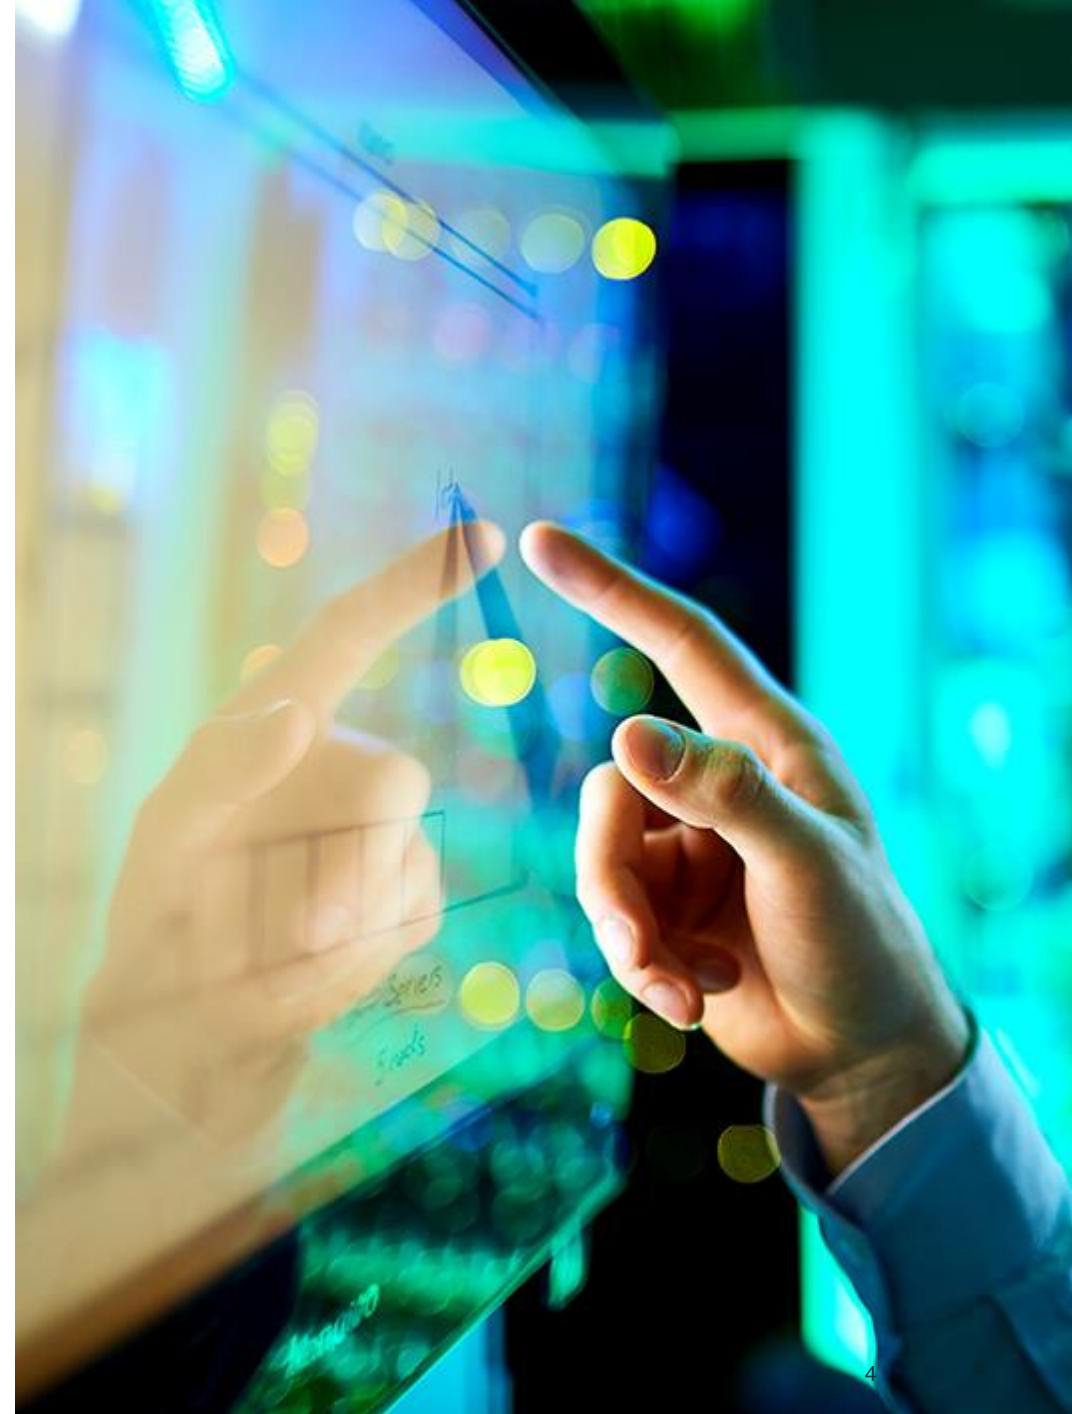

Kontakt/spørgsmål:



Allan S. Bager
Chefkonsulent
asb@ski.dk
21270827

